Тротуары слева		0,003 - 0,455, (452 м), а/б, ш. 1,5 м		0,479 - 0,611, (132 м), а/б, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Дорожная разметка слева					

Лягушинский с/с
д. Лукошино_ул. Подгорная
0,000-0,666

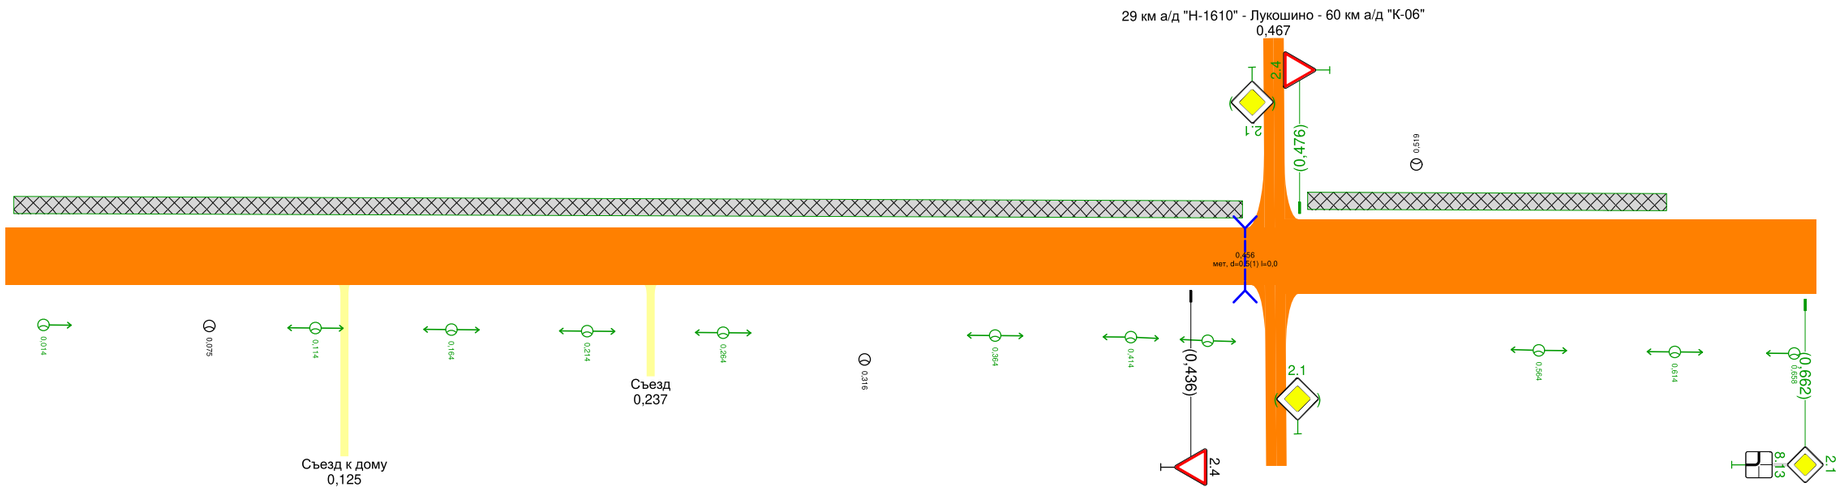

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомость дорожных знаков

д. Лукошино_ул. Подгорная

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,436	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,476	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	I	-	0,662	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	1						
Итого требуется:	2						
Итого к демонтажу:	0						
Итого:	3						
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	I	-	0,662	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	1						
Итого к демонтажу:	0						
Итого:	1						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	4

Ведомость искусственного освещения

д. Лукошино_ул. Подгорная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,014	0,658		11/11	644	0/0	0	11/11	644	Правая кромка
2	0,075	0,075		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,075	0,075		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,313	0,313		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,316	0,316		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,519	0,519		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				**16/16**	**644**	**5/5**		**11/11**	**644**	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

д. Лукошино_ул. Подгорная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,003	0,455	Слева	1,5		Асфальтобетон	452		452
2	0,479	0,611	Слева	1,5		Асфальтобетон	132		132
						Итого:	**584**		**584**
